

HECTOR M. ESTRADA A.

a r q u i t e c t o

CHIHUAHUA, CHIH.07 DE JUNIO DE 2017

ARQ. JORGE PALACIOS C.
RESIDENTE LA OBRA

ANEXO ESTIMACION No. **5 (ULTIMA)** CON FACTURA **207** CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA :
REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN PERIFERICO VICENTE LOMBARDO TOLEDANO Y ARROYO LOS NOGALES, SENTIDO NORTE
SUR.

DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PERÍODO DE 24 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DE 2017
POR UN SALDO NETO FACTURADO DE **\$1,129,829.98** CON IVA INCLUIDO

ACOMPAÑADA DE LOS NÚMEROS GENERADORES, FOTOGRAFÍAS Y CROQUIS ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA LA
PROCEDENCIA DE SU PAGO; PARA SU REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN

ATENTAMENTE



ARQ. HECTOR MANUEL ESTRADA ARAGONES

RECIBE



ARQ. JORGE PALACIOS C.

HECTOR M. ESTRADA A.

a r q u i t e c t o

CHIHUAHUA, CHIH.07 DE JUNIO DE 2017

ARQ. JORGE PALACIOS C.
RESIDENTE LA OBRA

ANEXO ESTIMACION No. **5 (ULTIMA)** CON FACTURA **207** CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA :
REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN PERIFERICO VICENTE LOMBARDO TOLEDANO Y ARROYO LOS NOGALES, SENTIDO NORTE
SUR.

DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PERÍODO DE 24 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DE 2017
POR UN SALDO NETO FACTURADO DE **\$1,129,829.98** CON IVA INCLUIDO


ACOMPAÑADA DE LOS NÚMEROS GENERADORES, FOTOGRAFÍAS Y CROQUIS ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA LA
PROCEDENCIA DE SU PAGO; PARA SU REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN

ATENTAMENTE



ARQ. HECTOR MANUEL ESTRADA ARAGONES

RECIBE



ARQ. JORGE PALACIOS C

Folio Fiscal
a637207c-a189-4711-9159-ea870311dcf9
Serie: Folio: 207
Número de Certificado del Emisor
00001000000300574680
Lugar y Fecha de Emisión
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, 2017-06-07T15:04:34

HECTOR MANUEL ESTRADA ARAGONES
EAAH430625GA5
PRIVADA LUIS PASTEUR 411
CUAHUTEMOC CHIHUAHUA CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31240
Rég. Fiscal: ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

FACTURA
Lugar y Fecha de certificación
México Distrito Federal, 2017-06-07T15:04:37
Proveedor de Certificación de CFDI
AURORIAN S.A. DE C.V.
www.konesh.com.mx
Número Certificado del SAT: 00001000000404624465

Nombre del Cliente
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC del Cliente
MCI651010V22

Dirección del Cliente
CALLE MINA 408
CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA
CHIHUAHUA MEXICO C.P. 31000

CANT/UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	No Aplica	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN PERIFERICO VICENTE LOMBARDO TOLEDANO Y ARROYO LOS NOGALES, SENTIDO NORTE SUR.	\$ 0.00	\$ 0.00
1.00	No Aplica	ESTIMACION NUMERO 5 (ULTIMA)	\$ 0.00	\$ 0.00
1.00	No Aplica	SEGÚN CONTRATO NUM. 265/2016	\$ 0.00	\$ 0.00
1.00	No Aplica	ALCANCE DE LA ESTIMACION	\$ 973,991.36	\$ 973,991.36
1.00	No Aplica	RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO	\$ 0.00	\$ 0.00
1.00	No Aplica	C.M.I.C. DEL 0.2% \$ 1,947.98	\$ 0.00	\$ 0.00
1.00	No Aplica	D.I.F. 0.2% \$ 1,947.98	\$ 0.00	\$ 0.00
1.00	No Aplica	SUMA \$ 3,895.96	\$ 0.00	\$ 0.00
1.00	No Aplica	NETO A RECIBIR \$ 1,125,934.02	\$ 0.00	\$ 0.00

IMPORTE EN LETRAS
UN MILLÓN CIENTO VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 98/100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
ZyDAhvDp6o0v5V4B/UhxXeiH62ITP8RTX+2VXkyj0pEvlc0S5ngIRDrU7TC0NrQKjU9+u+A1PLymoCmDKYr8Qapdd5kQgEwPe55nrxfINLG5
0j3HnacfW/4aBvCCAvhJNC8UVIbjsIHQ5FaQ+4ILuBkRmyFxRFRtGINzjA65Q=

SELLO DIGITAL DEL SAT
mY17oJOd4Nz5MYL9WK9cyQVfoqanzVico05hDAEfAzA+9hRvjM5nTyOe0xcRAiU0JRAvzU8kxLjzrLbjR7nkdgN9H/EAUwmAW70d7yO6dotVT
zjFBTVQHVQJ47xHAF3pBukxZ0JWtIpYVRcC751M06awAPbShM/lfhsrRa2M1J1ZyFNCKK539DrenEudeb3uyUUNog6IKSikhp5W/4iRE+3YdTtbc1qk0mc2LIOZ+xfBwmLAp8F1fZ3jyb1eLxUnV
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
||1.0|a637207c-a189-4711-9159-ea870311dcf9|2017-06-07T15:04:37|ZyDAhvDp6o0v5V4B/UhxXeiH62ITP8RTX+2VXkyj0pEvlc0S5ngIRDrU7TC0NrQKjU9+u+A1PLymoCmDKYr8Qapdd5kQgEwPe55nrxfINLG5|0j3HnacfW/4aBvCCAvhJNC8UVIbjsIHQ5FaQ+4ILuBkRmyFxRFRtGINzjA65Q=|00001000000404624465||

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: CONTADO



SUB-TOTAL	\$ 973,991.36
Total de Impuestos Traslados	\$ 155,833.62
Total de Impuestos Retenidos	\$ 0.00
IVA 16.00%	\$ 155,833.62
TOTAL	\$ 1,129,829.98

Este documento es una representación impresa de un CFDI



gob.mx

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



RFC del Emisor	Nombre o Razón Social del Emisor	RFC del Receptor	Nombre o Razón Social del Receptor
EAH430625GA5	HECTOR MANUEL ESTRADA ARAGONES	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio Fiscal	Fecha de Expedición	Fecha Certificación SAT	PAC que Certificó
A637207C-A189-4711-9159-EA870311DCF9	2017-06-07T15:04:34	2017-06-07T15:04:37	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del Comprobante	Estado CFDI	
\$1,129,829.98	ingreso	Vigente	

Imprimir



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA:	PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL	CONTRATO No. 265/2016	CONTRATADOS
OBRA:	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN PERIFERICO VICENTE LOMBARDO TOLEDANO Y ARROYO LOS NOGALES, SENTIDO NORTE SUR.	ESTIMACIÓN No. 5 (ULTIMA)	\$ 2,177,556.79 CON IVA
		PERÍODO EJEC. 24 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DE 2017	
REFERENCIA:	LATITUD	LONGITUD	
	28.635772	-105.981893	
UBICACIÓN:	PERIFERICO LOMBARDO TOLEDANO Y ARROYO LOS NOGALES	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 1,129,829.98 CON IVA
CONTRATISTA:	ARQ. HECTOR MANUEL ESTRADA ARAGONES	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 991,746.06 CON IVA
RFC	EAAH430625-GA5	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 2,121,576.04 CON IVA

	TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
	<u>NORMALES</u>	\$ 780,783.08	
	<u>EXCEDENTES</u>	\$ 104,311.44	
	<u>EXTRAS</u>	\$ 88,896.84	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)		\$ 973,991.36	

DESCUENTOS

0.2% C.M.I.C.	\$	1,947.98
0.2% DIF	\$	1,947.98
SUMA DESCUENTOS	\$	3,895.96

RESUMEN

SUMA ESTA ESTIMACION	\$	973,991.36
AMORT ANTICIPO	\$	0.00
SUB-TOTAL	\$	973,991.36
I.V.A.	\$	155,838.62
TOTAL	\$	1,129,829.98

(CON LETRA)

(UN MILLON CIENTO VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 98/100 M.N.)

DESCUENTOS	\$	3,895.96
SALDO NETO A RECIBIR	\$	1,125,934.02

AUTORIZO

ELABORO

ARQ. JORGE PALACIOS C.
RESIDENTE D.O.P.M

ARQ. HECTOR MANUEL ESTRADA ARAGONES
CONTRATISTA

Vo. Bo.

REVISO

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA
SUBDIRECTOR DE
INFRAESTRUCTURA URBANA

ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA
JEFE DEL DEPTO DE CONSTRUCCION.

Vo. Bo.

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CHIHUAHUA, CHIH.,

21 DE MARZO DE 2017

RECIBIMOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO, LA CANTIDAD DE: \$ 1,125,934.02
(UN MILLON CIENTO VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 02/100M.N.) COMO PAGO A LA
ESTIMACIÓN NUM. 5 (ULTIMA) CONTRATO No. 265/2016 POR LA CANTIDAD DE \$ 2,177,556.79
DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL 79/100 M.N. POR TRABAJOS EN LA OBRA:
REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN PERIFERICO VICENTE LOMBARDO TOLEDANO Y ARROYO LOS NOGALES, SENTIDO
NORTE SUR.

	ALCANCE DE LA ESTIMACION	\$	973,991.36
	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	\$	-
	SUBTOTAL	\$	973,991.36
	IVA	\$	155,838.62
RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO	TOTAL	\$	1,129,829.98
C.M.I.C. DEL 0.2%	1,947.98		
D.I.F. DEL 0.2%	1,947.98		
SUMA	3,895.96		

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO

	CONTRATO
IMPORTE CONTRATADO	\$ 2,177,556.79
CONVENIO MODIFICATORIO	\$ -
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	\$ 991,746.06
ESTA ESTIMACION	\$ 1,129,829.98
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION	\$ 2,121,576.04
POR EJERCER	\$ 55,980.75

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO

	CONTRATO
IMPORTE DE ANTICIPO	\$ -
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -
ESTA ESTIMACION	\$ -
ACUMULADO ACTUAL	\$ -
POR AMORTIZAR	\$ -

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

	0.2% D.I.F.	0.2% C.M.I.C.
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 1,709.91	\$ 1,709.91
ESTA ESTIMACION	\$ 1,947.98	\$ 1,947.98
ACUMULADO ACTUAL	\$ 3,657.89	\$ 3,657.89

R E C I B I M O S

ARQ. HECTOR MANUEL ESTRADA ARAGONES
EAAH430625-GA5

OBRA: REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN PERIFERICO VICENTE LOMBARDO TOLEDANO Y ARROYO LOS NOGALES, SENTIDO NORTE SUR. UBICACIÓN: PERIFERICO LOMBARDO TOLEDANO Y ARROYO LOS NOGALES No. CONTRATO: 265/2016 ESTIMACIÓN No. 5 (ULTIMA)

CONTRATIST ARQ. HECTOR MANUEL ESTRADA ARAGONES PERÍODO: 24 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DE 2017

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS	
No.	IMPORTE

NORMALES

780,783.08

EXCEDENTES

104,311.44

EXTRAS

88,896.84

SUBTOTAL	973,991.36
I.V.A.	155,838.62
TOTAL	1,129,829.98

POR EL CONTRATISTA

ARQ. HECTOR M. ESTRADA ARAGONES

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

ARQ. JORGE PALACIOS C.

OBRA: REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN PERIFERICO VICENTE LOMBARDO TOLEDANO Y ARROYO LOS NOGALES, SENTIDO NORTE SUR.

UBICACIÓN PERIFERICO LOMBARDO TOLEDANO Y ARROYO LOS NOGALES

Nº CONTRATO 265/2016

ESTIMACIÓN No. 5 (ULTIMA)
PERIODO: 24 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DE 2017

CONTRATISTA: ARQ. HECTOR MANUEL ESTRADA ARAGONES

CONCEPTOS	DESCRIPCIÓN	PROYECTO UNIDAD	VOLUMEN	VOLUMENES ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	VOL. ESTIMADO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
No.								
<u>OBRA NORMAL</u>								
E.P-7	ZAMPEADO A BASE DE MAMPOSTERIA DE 30 CMS. DE ESPESOR, UTILIZANDO MORTERO CEMENTO- ARENA DE RESISTENCIA DE 60 KG/ CM2	m2	583.68	559.64	105.00	454.64	\$831.01	377,810.39
E.P-14	RELLENO Y COMPACTACION AL 90% DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION	m2	262.40	48.54	0.00	48.54	\$146.43	7,107.71
E.P-10	LOSA DE CONCRETO FC=250 KG/CM2 CON ESPESOR VARIABLE ARMADA SEGUN PLANO INC. GANCHOS,BASTONES , TRASLAPES, VIBRADO, MEMBRANA DE CURADO ,CIMBRA Y DESCIMBRA.	m2	210.00	171.12	0.00	171.12	\$1,305.93	223,470.74
E.P-13.	GUARNICION DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 23 CMS. DE ANCHO SUPERIOR ,40 CMS. DE ANCHO INFERIOR Y 30 CMS. DE ALTURA INC. ARMADO SEGUN PLANO, CIMBRADO, COLADO Y CURADO.	ml	41.20	37.20	0.00	37.20	\$351.79	13,086.59
E.P-13	PARAPETO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 ARMADO SEGUN PLANO DE 20X20X40 CMS. CON TUINO EN ARISTAS ARMADO CON VARILLAS #6 Y ESTRIBOS DE 1/2" ANCLADAS A GUARNICION.	pieza	24.00	24.00	0.00	24.00	\$5,248.85	125,972.40
E.P-6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE NEOPRENOS DE APOYO DE LOSA DE 20X25 CMS. Y 2.5 CMS. DE ALTURA, DUREZA DE 60 SHORE.	pzas	16.00	16.00	0.00	16.00	\$1,265.79	20,252.64
E.P-5	SOBRE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 3 CMS. DE ESPESOR.	m3	3.00	3.00	0.00	3.00	\$4,360.87	13,082.61
<u>OBRA EXCEDENTE</u>								
E.P-13	PARAPETO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 ARMADO SEGUN PLANO DE 20X20X40 CMS. CON TUINO EN ARISTAS ARMADO CON VARILLAS #6 Y ESTRIBOS DE 1/2" ANCLADAS A GUARNICION	pieza	24.00	35.00	24.00	11.00	\$5,248.85	\$57,737.35
E.P-5	SOBRE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 3 CMS. DE ESPESOR.	m3	3.00	13.68	3.00	10.68	\$4,360.87	46,574.09
<u>OBRA EXTRA</u>								
								\$780,783.08
								377,810.39
								7,107.71
								223,470.74
								13,086.59
								125,972.40
								20,252.64
								13,082.61
								\$104,311.44
								\$57,737.35
								46,574.09
								\$88,896.84

POR EL CONTRATISTA

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

OBRA: REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN PERIFERICO VICENTE LOMBARDO TOLEDANO Y ARROYO LOS NOGALES, SENTIDO NORTE SUR.

UBICACIÓN PERIFERICO LOMBARDO TOLEDANO Y ARROYO LOS NOGALES No CONTRATO 265/2016

CONTRATISTA:

ARQ. HECTOR MANUEL ESTRADA ARAGONES

ESTIMACIÓN No. 5 (ULTIMA)

PERIODO: 24 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DE 2017

CONCEPTOS No.	DESCRIPCIÓN	PROYECTO UNIDAD	VOLUMEN	VOLUMENES		VOL. ESTIMADO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				ACUM. TOTAL	ACUM. ANTERIOR			
EXT-02	REPÓSICION DE DEFENSA METALICA GALVANIZADA DE 2 CRESTAS CALIBRE 12, TRAMO DE 3.81 ML. INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MAQUINARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	PZA	0.00	24.00	0.00	24.00	2,858.14	68,595.36
EXT-03	REPOSICION DE POSTE METALICO PARA DEFENSA METALICA INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MAQUINARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	PZA	0.00	2.00	0.00	2.00	952.30	1,904.60
EXT-04	REPOSICION DE TERMINALES DE DEFENSA METALICA GALVANIZADA DE 2 CRESTAS CAL 12. INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MAQUINARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	PZA	0.00	4.00	0.00	4.00	722.33	2,889.32
EXT-05	CONSTRUCCION DE LAVADERO DE CONCRETO FC= 200 KG/CM2 DE 7 CMS DE ESPESOR EN TALUDES, ACABADO PULIDO. INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MAQUINARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	M2	0.00	21.11	0.00	21.11	357.17	7,539.86
EXT-06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA TRAFICO PESADO PARA RAYA DE 13.5 CMS DE ANCHO, SEGUN COLOR AUTORIZADO POR LA RESIDENCIA DE SUPERVISION. INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MAQUINARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	ML	0.00	390.00	0.00	390.00	20.43	7,967.70

POR EL CONTRATISTA

POR EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

ARQ. HECTOR M. ESTRADA ARAGONES

Pag 2 de 2

ARQ. JORGE PATACIOS C.

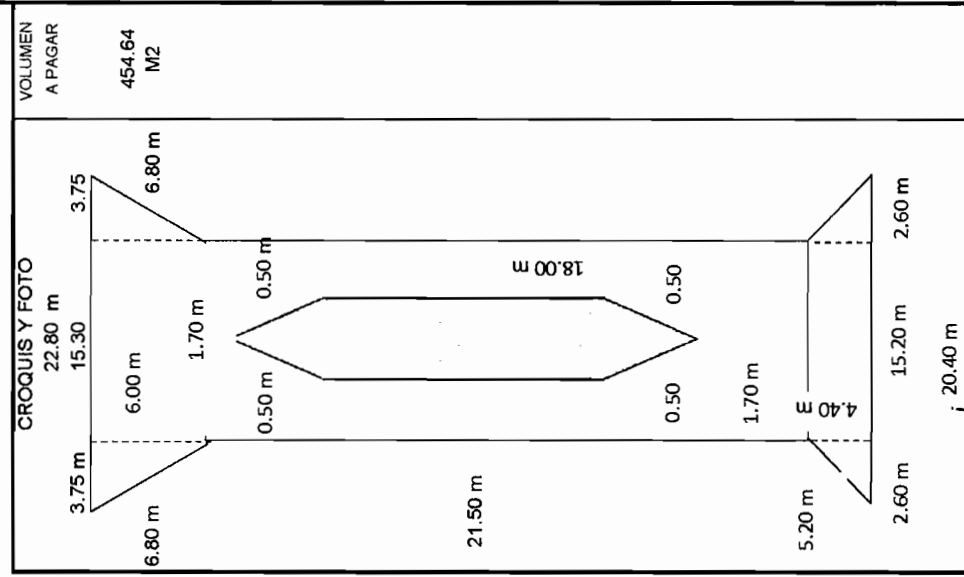
GENERADOR DE ESTIMACION

HOJA 1 / 12

CONTRATO 285/2016		REFERENCIA: LATITUD 28.635772, LONGITUD -105.981893	
REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN PERIFERICO VICENTE LOMBARDO TOLEDANO Y ARROYO LOS NOGALES, SENTIDO NORTE SUR.		ARQ. HECTOR MANUEL ESTRADA ARAGONES	
OBRA :		CONTRATISTA:	
No DE ESTIMACION: 5 PERIODO : 24 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DE 2017			
CONCEPTO	E.P-7	OPERACIONES ARITMETICAS	
ZAMPEADO A BASE DE MAMPOSTERIA DE 30 CMS. DE ESPESOR UTILIZANDO MORTERO CEMENTO-ARENA DE		Area central $21.50 \times 15.25 = 327.88m^2$	
		Columna $18.50 \times 1.70 = 31.45m^2$	
		Area triangular $0.50 \times 0.5 \times 4 pzas = 1 m^2$	
		$31.45 - 1 m^2 = 30.45 m^2$	
		$327.88 - 30.45 = 297.43 m^2$	
		Area sur	
		$3.75 \times 5.7 / 2 = 11.25 m^2 \times 2 pzas = 22.50 m^2$	
		$15.30 \times 5.70 = 87.21m^2$	
		Area norte	
		$15.20 m \times 4.40 m = 66.88 m^2$	
		$2.60 \times 4.40 / 2 = 5.72 \times 2 pzas = 11.44 m^2$	
		$297.43 + 22.50 + 87.21 + 66.88 + 11.44$	
		Area de piso $485.46 m^2$	
		Area de talud de pila	
		$18+0.50+0.50+18+0.50+0.50=38 \times 0.40 = 15.20 m^2$	
Area de estribos			
$6.80+21.50+5.20 \times 2 \text{ lados} = 67 \times 0.30 = 20.10 m^2$			
Dentellones			
$22.80+20.40 = 43.20 \times 0.90 = 38.88 m^2$			
$485.46+15.20+20.10+38.88= 559.64 m^2$			
$559.64 \text{ menos } 105 \text{ estimados anterior} = 454.64 m^2$			

RESIDENTE
ARQ. JORGE PALACIOS C.

CONTRATISTA
ARQ. HECTOR M. ESTRADA ARAGONES



GENERADOR DE ESTIMACION

CONTRATISTA
ARQ. HECTOR M. ESTRADA ARAGONES

GENERADOR DE ESTIMACION

HOJA 4 / 12

CONTRATO 265/2016		REFERENCIA: LATITUD 28.835772, LONGITUD -105.981893	
OBRA: TOLEDANO Y ARROYO LOS NOGALES, SENTIDO NORTE SUR.		CONTRATISTA: ARQ. HECTOR MANUEL ESTRADA ARAGONES	
Nº DE ESTIMACION: 5		PERIODO: 24 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DE 2017	
CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS		VOLUMEN A PAGAR
GUARNICION DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 23 CMS. DE ANCHO SUPERIOR 40 CMS. DE ANCHO INFERIOR Y 30 CMS. DE ALTURA INC. ARMADO SEGUN PLANO, CIMBRADO, COLADO Y CURADO.	18.60 m x 2 pzas= 37.20		37.20 ML
			CROQUIS Y FOTO
			

RESIDENTE
ARQ. JORGE PALACIOS C.

CONTRATISTA
ARQ. HECTOR M. ESTRADA ARAGONES

HOJA 5 / 12

RESIDENTE
ARQ. JORGE PALACIOS C.

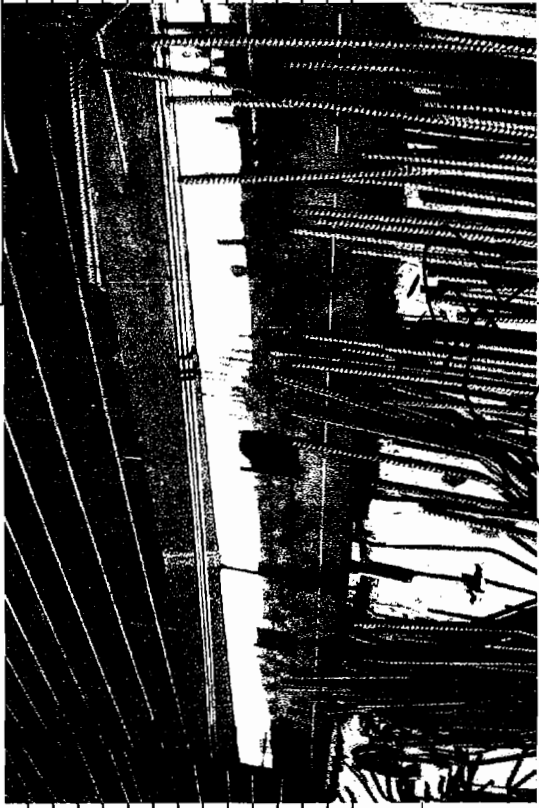
/ CONTRATISTA
ARQ. HECTOR M. ESTRADA ARAGONES

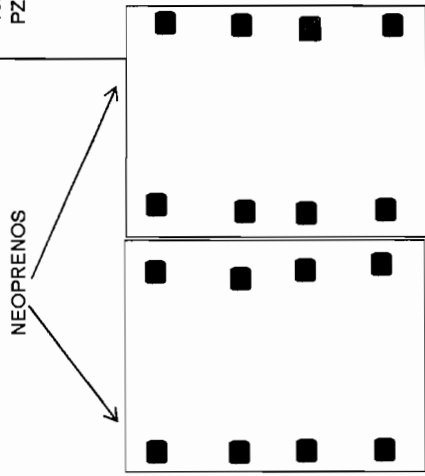
GENERADOR DE ESTIMACION

HOJA 6 / 12

CONTRATO 265/2016		REFERENCIA: LATITUD 28.635772, LONGITUD -105.981893
OBRA :	TOLEDANO Y ARROYO LOS NOGALES, SENTIDO NORTE SUR.	CONTRATISTA: ARQ. HECTOR MANUEL ESTRADA ARAGONES

Nº DE ESTIMACION: 5	PERIODO : 24 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DE 2017
---------------------	--

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS
Ep-6	16 PZAS
SUMINISTRO Y COLOCACION DE NEOPRENOS DE APOYO DE LOSA DE 20X25 CMS. Y 2.5 CMS. DE ALTURA, DUREZA DE 60 SHORE.	
	

CROQUIS Y FOTO	VOLUMEN A PAGAR
	16.00 PZAS

RESIDENTE
ARQ. JORGE PALACIOS C.

CONTRATISTA
ARQ. HECTOR M. ESTRADA ARAGONES

GENERADOR DE ESTIMACION

HOJA 7 / 12

CONTRATO 285/2016		REFERENCIA: LATITUD 28.635772, LONGITUD -105.981893	
REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN PERIFERICO VICENTE LOMBARDO TOLEDANO Y ARROYO LOS NOGALES, SENTIDO NORTE SUR.		ARQ. HECTOR MANUEL ESTRADA ARAGONES	
CONTRATISTA:			
No DE ESTIMACION: 5 PERIODO : 24 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DE 2017			
CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS	CROQUIS Y FOTO	
SOBRE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 3 CMS. DE ESPESOR.	171.12 M2 X 8 cm de espesor promedio	9.20 m 9.30 m 9.30 m 03cm 06 cm 15cm LOSA NUEVA	
		VISTA LATERAL DE LOS ESPESORES EMPATE DE PAVIMENTO EXISTENTE	
		VOLUMEN A PAGAR 13.68 M3	

RESIDENTE
 ARQ. JORGE PALACIOS C.

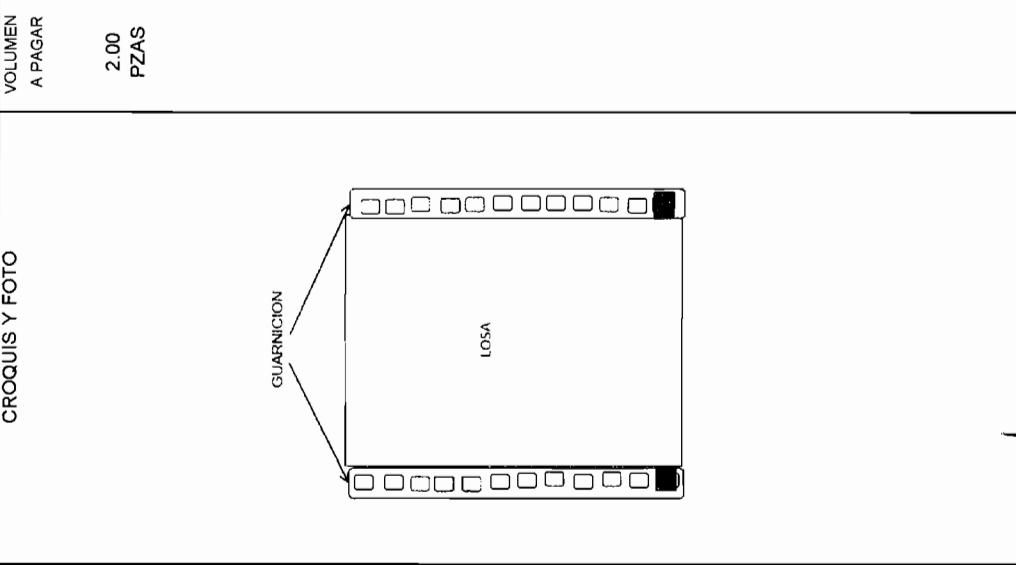
CONTRATISTA
 ARQ. HECTOR M. ESTRADA ARAGONES

HOJA 8 / 12

CONTRATISTA
ARQ. HECTOR M. ESTRADA ARAGONES

HOJA 9/12

No DE ESTIMACION: 5 PERIODO : 24 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DE 2017

CROQUIS Y FOTO		VOLUMEN A PAGAR
		2.00 PZAS



~~RESIDENTE~~
ARQ. JORGE PALACIOS C.

GENERADOR DE ESTIMACION

HOJA 10 / 12

CONTRATO 265/2016		REFERENCIA: LATITUD 28.635772, LONGITUD -105.981893
OBRA :	TOLEDANO Y ARROYO LOS NOGALES, SENTIDO NORTE SUR.	CONTRATISTA: ARQ. HECTOR MANUEL ESTRADA ARAGONES

Nº DE ESTIMACION: 5	PERIODO : 24 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DE 2017
---------------------	--

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS
REPOSICION DE TERMINALES DE DEFENSA METALICA GALVANIZADA DE 2 CRESTAS CAL 12, INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION Y TORNILLERIA ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	4 pzas



RESIDENTE
ARQ. JORGE PALACIOS C.

CROQUIS Y FOTO	VOLUMEN A PAGAR
	4.00 PZAS

CONTRATISTA
ARQ. HECTOR M. ESTRADA ARAGONES

HOJA 11/12

7 CONTRATISTA
ARQ. HECTOR M. ESTRADA ARAGONES

GENERADOR DE ESTIMACION

HOJA 12 / 12

CONTRATO 265/2016	REFERENCIA: LATITUD 28.635772, LONGITUD -105.981893
OBRA : TOLEDANO Y ARROYO LOS NOGALES, SENTIDO NORTE SUR.	CONTRATISTA: ARQ. HECTOR MANUEL ESTRADA ARAGONES

Nº DE ESTIMACION: 5	PERIODO : 24 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DE 2017
---------------------	--

CONCEPTO	OPERACIONES ARITMETICAS
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA TRAFICO PESADO SEGUN COLOR AUTORIZADO POR LA SUPERVISION, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	165 ML X 2 LINEAS CONTINUAS= 330 ml
	12 GUIONES DE 5M = 60 ml



CROQUIS Y FOTO	VOLUMEN A PAGAR
	390.00 ML

RESIDENTE
ARQ. JORGE PALACIOS C.

CONTRATISTA
ARQ. HECTOR M. ESTRADA ARAGONES



22 de marzo de 2017

**ARQ. HECTOR M. ESTRADA ARAGONES
P R E S E N T E.-**

Con relación a su Escrito S/N de fecha 15 de marzo del presente, en el que solicita la revisión de los precios extraordinarios de la obra: **"REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN PERIFERICO LOMBARDO TOLEDANO Y ARROYO LOS NOGALES, SENTIDO NORTE-SUR"**, que al amparo del contrato No. **265/2016**, ejecuta su representada, al respecto, por este conducto le comunico, que una vez revisados y analizados los mismos, se autorizan los precios unitarios que a continuación se relacionan:

No.	CONCEPTO	VOL.	UNI	PRECIO AUTORIZADO
EXT-02	Reposición de defensa metálica galvanizada de 2 crestas calibre 12 de 3.81 m. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	24	pza	\$2,858.14
EXT-03	Reposición de poste metálico para defensa metálica.: Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	2	pza	\$952.30
EXT-04	Reposición de terminales de defensa metálica galvanizada de 2 crestas cal. 12: Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	4	pza	\$722.33
EXT-05	Construcción de lavadero de concreto $fc=200$ kg/cm ² , de 7 cms de espesor en taludes, acabado pulido. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	21.11	M2	\$357.17
EXT-06	Suministro y colocación de pintura tráfico pesado para raya de 13.5 cms de ancho, según color autorizado por la Residencia de Supervisión: Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	390	m	\$20.43

IMPORTE MÁXIMO AUTORIZADO \$88,896.84 SIN IVA

ATENTAMENTE

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C.c.p.- Arq. Carlos Aguilar García.-Subdirector de Infraestructura Urbana.
C.c.p.-Ing. Edga Lizette Del Río Sigala.-Jefe del Departamento de Construcción
C.c.p.-Ing. Oscar Reyes López.-Residente de Obra
C.c.p.-Archivo.

CHCG/CAG/ELDS/gh

"2017, Año del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"




22 de marzo de 2017

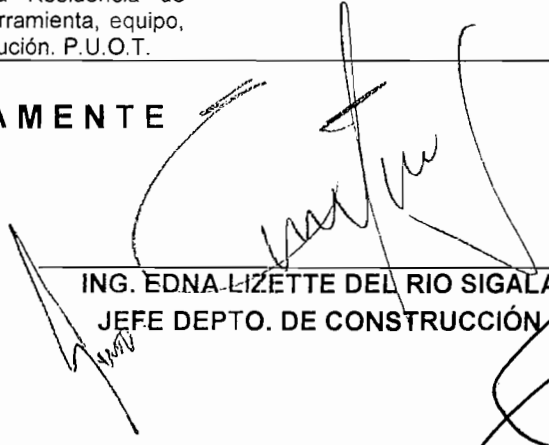
ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
P R E S E N T E.-

Con fundamento en los resultados de la revisión realizada a la solicitud de los precios unitarios fuera de catálogo presentado por el **ARQ. HECTOR M. ESTRADA ARAGONES**, quien ejecuta la obra: **"REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN PERIFERICO LOMBARDO TOLEDANO Y ARROYO LOS NOGALES, SENTIDO NORTE-SUR"** al amparo del **CONTRATO No. 265/2016**, le solicitamos la autorización de los mismos.

No.	CONCEPTO	PRECIO SOLICITADO	UNI	PRECIO AUTORIZADO
EXT-02	Reposición de defensa metálica galvanizada de 2 crestas calibre 12 de 3.81 m. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	\$3,151.40	pza	\$2,858.14
EXT-03	Reposición de poste metálico para defensa metálica. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	\$952.30	pza	\$952.30
EXT-04	Reposición de terminales de defensa metálica galvanizada de 2 crestas cal. 12. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	\$722.33	pza	\$722.33
EXT-05	Construcción de lavadero de concreto $f_c=200$ kg/cm ² , de 7 cms de espesor en taludes, acabado pulido. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	\$354.17	M2	\$357.17
EXT-06	Suministro y colocación de pintura tráfico pesado para raya de 13.5 cms de ancho, según color autorizado por la Residencia de Supervisión. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	\$37.29	m	\$20.43

ATENTAMENTE


ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
URBANA


ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA
JEFE DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN

C.c.p.- Archivo.
gcn*

CONTROL DE TRAMITE DE ESTIMACIONES

DATOS GENERALES			
FOLIO	NUMERO DE ESTIMACION	FACTURA	SALDO NETO
	5 (ULTIMA)		1,129,829.98
OBRA	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN PERIFERICO VICENTE LOMBARDO TOLEDANO Y ARROYO LOS NOGALES, SENTIDO NORTE SUR.		
CONTRATISTA:	ARQ. HECTOR MANUEL ESTRADA ARAGONES	UBICACIÓN	PERIFERICO LOMBARDO TOLEDANO Y ARROYO LOS NOGALES
RESIDENTE	ARQ. JORGE PALACIOS C.	CONTRATO No.	265/2016

RESUMEN DE AUTORIZACIONES				
AUTORIZACION DE:	FECHA Y FIRMA RECIBIDO	FECHA Y FIRMA ENTREGA	CONTROL DE OBRA	
			FECHA Y FIRMA RECIBIDO	FIRMA Y FECHA ENTREGA
RESIDENTE	9 JUN 2017	9 JUN 2017		
JEFE DEPARTAMENT				
SUBDIRECTOR				
X DIRECTOR				

EN CASO DE 1ª DEVOLUCION DE LA ESTIMACION	
FECHA	
EXPLICACION	

EN CASO DE 2ª DEVOLUCION DE LA ESTIMACION	
FECHA	
EXPLICACION	

EN CASO DE 3ª DEVOLUCION DE LA ESTIMACION	
FECHA	
EXPLICACION	



Dirección de Obras Públicas
Subdirección de Infraestructura Urbana
Departamento de Construcción
